


POINT DE SITUATION DU PROJET LOREGAZ ACTUALISE AU 31/3/2021



Activités sur la période janvier – mars 2021

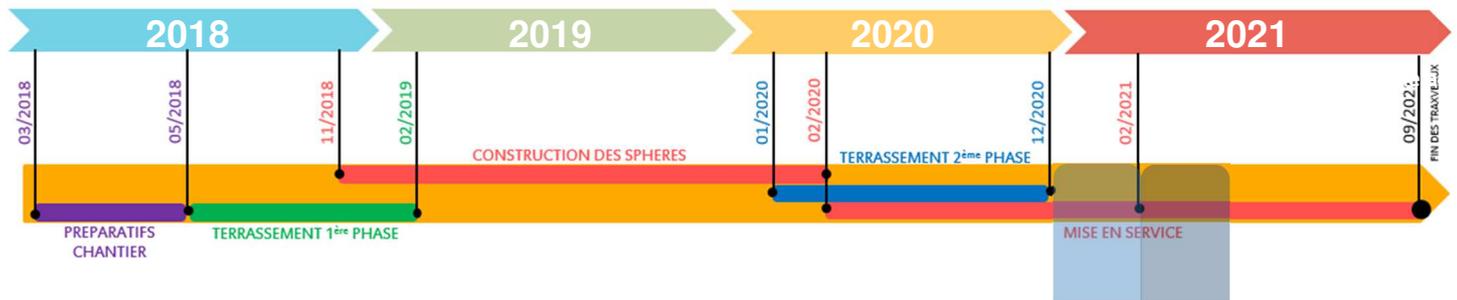

Fin des activités de construction tous corps d'états confondus marquée par la pose des enrobés

Activités à venir sous 3 mois



Obtention de la certification d'ensemble DESP pour permettre la mise en gaz,

Vérification et achèvement mécaniques des différentes parties de l'installation,



Mise en service des installations et de leurs sécurités,

Essais de performances individuelles puis d'ensemble.

Points d'attention

- ❖ Début de mise en gaz des installations ; fin avril 2021,
- ❖ 1^{ère} livraison de propane ; fin mai 2021, avec utilisation des nouvelles installations de pistonnage au quai Jeanne d'Arc

