


POINT DE SITUATION DU PROJET LOREGAZ ACTUALISE AU 31/3/2019

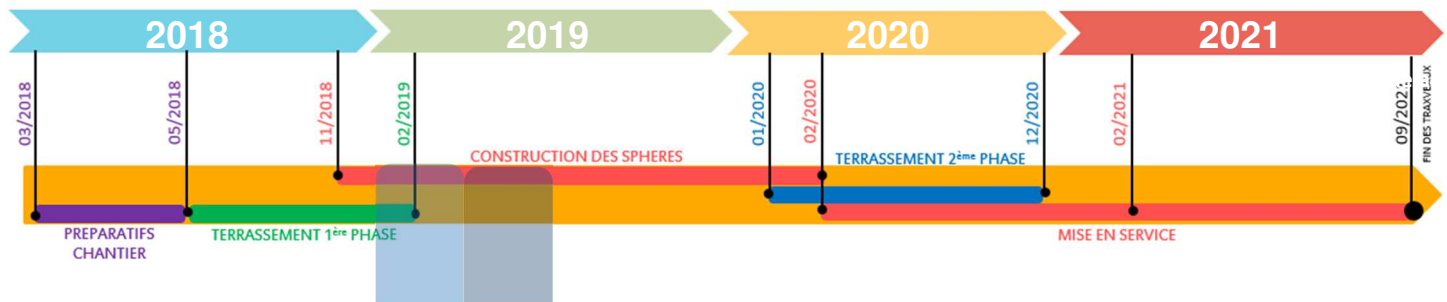

Activités sur la période janvier - mars 2019

Visite du chantier de construction du Vice-Président de la CAPA le 13/2/19.

- Construction des Sphères :
- Réalisation des 2 coquetiers béton,
 - Mise en soudage des tôles de sphères (50 éléments constituent une sphère),
 - Pose et verrouillage du demi-hémisphère inférieur de la sphère EST,
 - Livraison de 75 éléments de sphères.

Réalisation du parement des murs en gabions

Fin des opérations de valorisation des matériaux en zone 2, débutées en novembre 2018, le 26/3/19.



Activités à venir sous 3 mois

- Poursuite de la construction des sphères (durée 1 an)
- Pose des tuyauteries enterrées d'arrivée de propane
- Début de réalisation des différents bâtiments
- Début de pose des réseaux enterrés
- Pose de la clôture domaniale

Points d'attention

- 2 ha de nos 20 ha de terrains de compensation au Vignola ont été démaquisés illicitement. La DREAL a mis en demeure l'agriculteur de stopper ses travaux. Un remplacement de cette superficie est en cours de recherche avec le CEN-Corse.
- 2 tortues d'Hermann ont été trouvées sur le chantier et replacées dans leur milieu de prédilection. Le total est ainsi porté à 9 depuis le début de la construction.
