


POINT DE SITUATION DU PROJET LOREGAZ ACTUALISE AU 30/6/2019



Activités sur la période avril - juin 2019

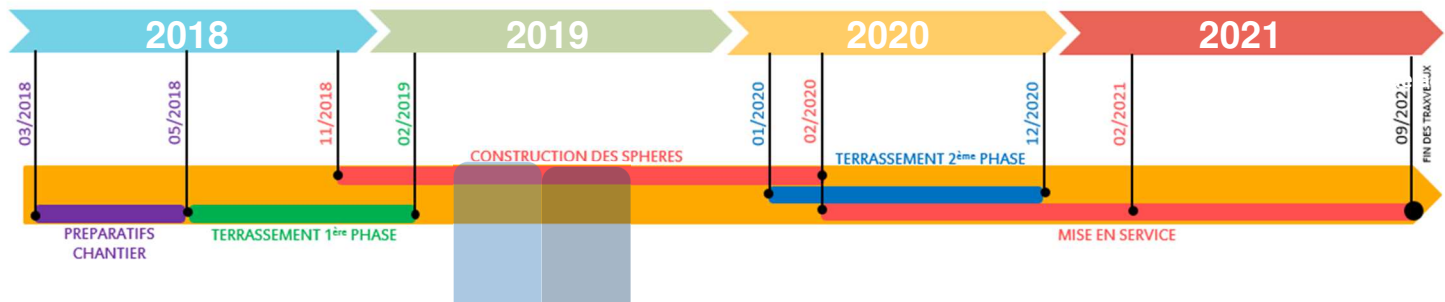

Exercices de secours d'urgence les 16/4/19, 23/5/19 avec le SIS2A et le 01/7/19 en interne chantier.

Construction des sphères :

- Réalisation des 1/2 hémisphères inférieurs des 2 sphères : montage, réglage et soudage,
- Montage des échafaudages intérieurs et extérieurs



Construction du poste de gardiennage,

Pose des tuyauteries gaz enterrées et des réseaux EU, EP et AEP enterrés.



Activités à venir sous 3 mois



Poursuite de la construction des sphères (durée totale 1 an),

Réalisation du bâtiment d'exploitation,



Continuation de la pose des réseaux enterrés,

Pose des câbles d'alimentation du poste électrique de la station.

Points d'attention



Le troisième comité « espèces protégées » regroupant la DREAL, le CSRPN, le CBNC, le CNRS, le CEN-C, ENDEMYS et ENGIE s'est tenu le 27/6/19. Les plans de gestion des terrains de compensation (21 ha) ont été validés dans leurs objectifs et leurs enjeux.

9 tortues d'Hermann ont été trouvées sur le chantier et replacées dans leur milieu de prédilection ce trimestre. Le total est ainsi porté à 18 depuis le début de la construction.
