


POINT DE SITUATION DU PROJET LOREGAZ ACTUALISE AU 30/9/2019

(Mi-Projet)

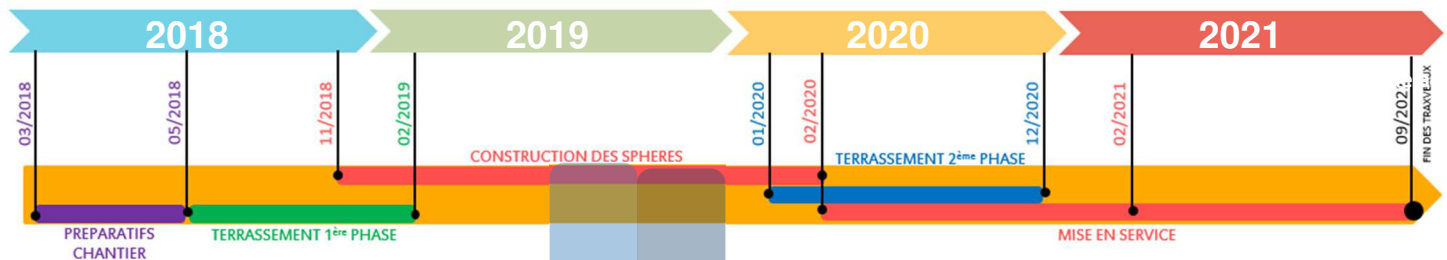

Activités sur la période juillet - septembre 2019

Construction des sphères :

- Renforcement des équipes de soudage des sphères ; 20 soudeurs sont désormais à la tâche, cette activité étant prévue jusqu'à fin novembre 2019,



Début des travaux de traversée de l'Arbitrone pour passage des tuyauteries de raccordement gaz aux installations du Loreto,

Début des travaux de construction du bâtiment d'exploitation ; dit « bâtiment administratif » :



Pistonnage instrumenté du « pipe » et du « sea-line » dans le cadre des adaptations du poste de déchargement Jeanne d'Arc pour le passage du Butane au Propane.

Pose du dôme de la sphère EST



Traversée de l'Arbitrone



Activités à venir sous 3 mois



Poursuite de la construction des sphères ; fin du soudage, mise en peinture, épreuve hydraulique,

Continuation de la construction du bâtiment d'exploitation,



Pose des câbles d'alimentation du poste électrique de la station.

Reprise des travaux de terrassement (2ème phase)

Points d'attention



5 tortues d'Hermann ont été trouvées sur le chantier et replacées dans leur milieu de prédilection ce trimestre. Le total est ainsi porté à 23 depuis le début de la construction.



Le 9 septembre 2019, déplacement d'une quarantaine de batraciens par notre écologue Endemys avant le début des travaux de traversée de l'Arbitrone. Suivi de ces travaux par la DREAL et la Police de l'Eau.
