


POINT DE SITUATION DU PROJET LOREGAZ ACTUALISE AU 31/3/2020

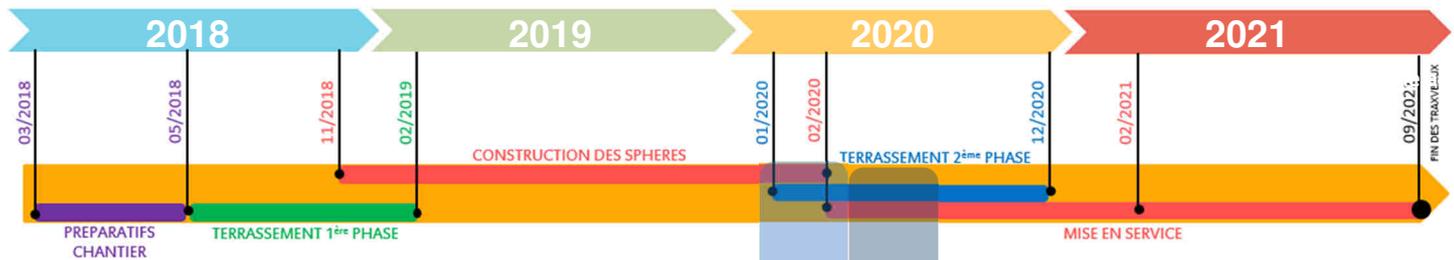

Activités sur la période janvier – mars 2020

Sphères :

- Epreuve hydraulique de la sphère OUEST le 18/2/20 puis mise en peinture après sablage,
- Coulage en continu de l'encoffrement de la sphère EST du 9 au 15/3/20.



Génie-Civil :

- Gros-œuvre des bâtiments « technique » et « atelier/magasin » en cours,
- Réalisation du radier du bassin d'eau de pluie.



Electricité :

- Mise en place du réseau de terre et raccordement,
- Mise en place du poste HTA.

Clôture :

- Début de pose de la clôture domaniale



Activités à venir sous 3 mois

Coulage de l'encoffrement de la sphère OUEST et ensablement des encoffrements



Poursuite du clôturage domanial

Reprise de la pose des tuyauteries enterrées



Raccordement et mise sous tension du poste HTA

Début des activités électriques ; pose des chemins de câbles, tirage des câbles

Points d'attention

Quelques nuisances sonores durant les opérations de sablage des sphères dont nous nous excusons et merci aux riverains pour leur compréhension.

Arrêt des activités de construction le 17/3/20 lié à la crise sanitaire du covid-19. Reprise le 20/4/20, avec des difficultés pour les entreprises à rejoindre la Corse (accès réglementé par la Préfecture).
