


# POINT DE SITUATION DU PROJET LOREGAZ ACTUALISE AU 30/6/2020

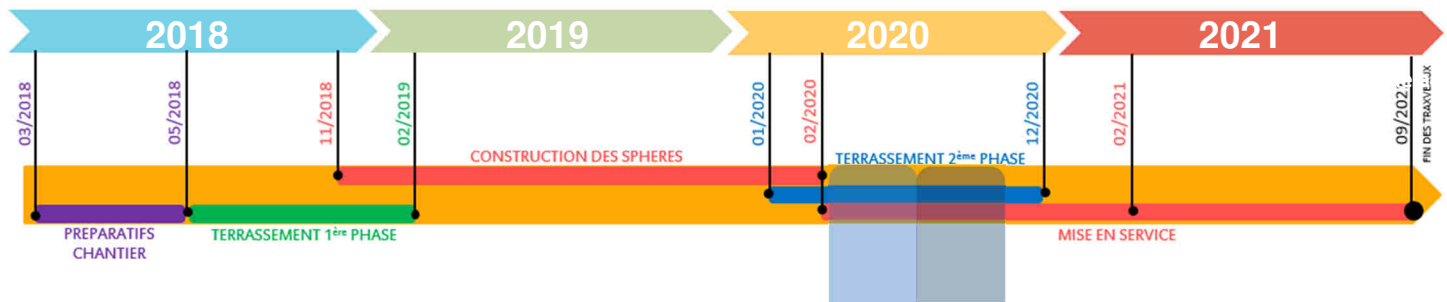

## Activités sur la période avril – juin 2020

### Sphères :

- Coulage en continu de l'encoffrement de la sphère OUEST du 25 au 30/5/20,
- Début d'ensablement avec pose de la protection cathodique des sphères,

### Génie-Civil :

- Mise hors d'eau et hors d'air des bâtiments,
- Coffrage/ferraillage du bassin d'eau de pluie en cours,

### Electricité :

- Mise sous tension du poste HTA (28/4/20)
- Pose des chemins de câbles

### Process :

- Livraison et pose des 4 vaporiseurs
- Réalisation et pose des tuyauteries gaz enterrées



## Activités à venir sous 3 mois

Peinture des encoffrements,

Réalisation du mur de soutènement entre sphères en gabions,

Poursuite de la pose des tuyauteries enterrées et pose des tuyauteries aériennes,

Tirage de câbles,

Construction du bâtiment chaudières.

## Points d'attention

- ❖ Aucun cas positif de Covid-19 sur le chantier malgré la population internationale présente (la surveillance perdue),
- ❖ Des difficultés d'acheminement du matériel et des hommes sur site dues aux restrictions d'accès à la Corse durant la période de déconfinement,
- ❖ Décalage des horaires de travail sur chantier pour éviter les fortes chaleurs de l'été.
