


# POINT DE SITUATION DU PROJET LOREGAZ ACTUALISE AU 31/12/2020



## Activités sur la période octobre – décembre 2020

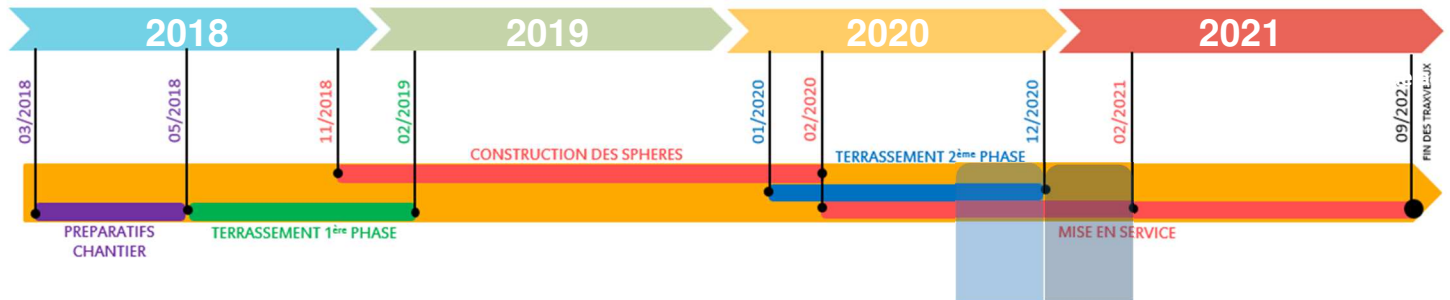

### Sphères :

- Installation des escaliers et plateformes des 2 encoffrements

### Génie-Civil :

- Réalisation du massif cheminée
- Réalisation du bâtiment chaudières
- Début des terrassement de seconde phase (entre les zones sphères et process)
- Travaux de second œuvre dans les différents bâtiments

### Electricité :

- Mise sous tension des transformateurs et du TGBT
- Tirage des câbles



### Process :

- Livraison et installation des chaudières
- Raccordements et épreuves hydrauliques des dernières tuyauteries

## Activités à venir sous 3 mois



Fin des travaux de construction, finalisation des clôtures, mise en place et raccordement de la cheminée des chaudières, travaux de voirie, mise à disposition des différents bâtiments,



Contrôles de fin de construction de l'ensemble des installations avant les opérations de mise en service,

Opérations de qualification des sphères.

## Points d'attention

- ❖ Travaux de réparation de la zone de compensation du Vignola (endommagée par un tiers) en décembre 2020 en collaboration avec le lycée agricole de Sartène (pose de fascines pour faire disparaître une piste créée illégalement),
- ❖ Fermeture du chantier du 24/12/20 au 03/1/21 pour les fêtes de fin d'année.
