


## POINT DE SITUATION DU PROJET LOREGAZ ACTUALISE AU 30/9/2018



### Activités sur la période juillet-septembre 2018

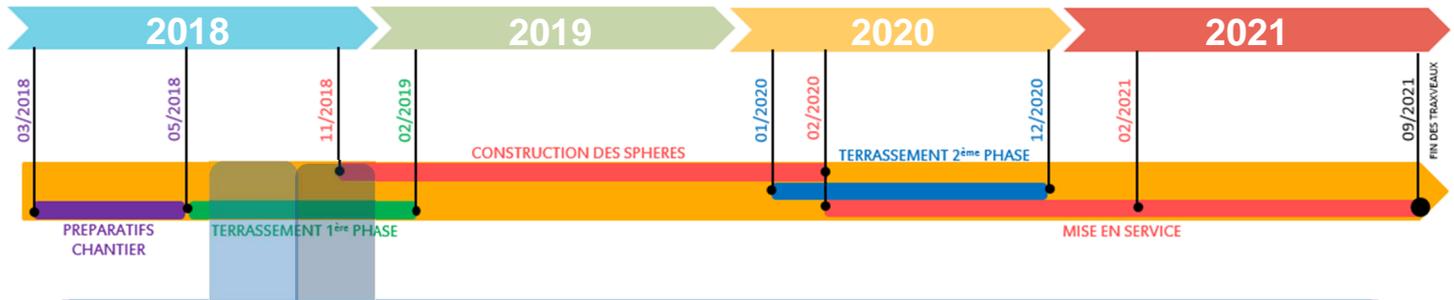

Poursuite des travaux de terrassement

- 62.000 m<sup>3</sup> de terre et roche mouvementés sur 67.000 m<sup>3</sup> (dont 25.000 m<sup>3</sup> stockés en contrebas de la carrière de St Antoine)
- Remblaiement de 30.500 m<sup>3</sup> sur 31.000 m<sup>3</sup> pour créer les différentes plateformes du futur site.



Réalisation des parois clouées Ouest et Est du site.



### Activités à venir




Réunion d'information des riverains avec visite du chantier de construction le 05/10/18

Montage des sphères (durée 1 an)



Réalisation des remblais paysagers à partir des matériaux extraits lors des opérations de terrassement

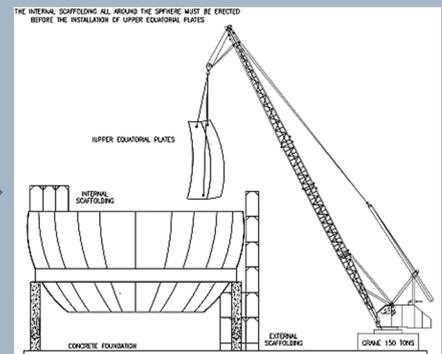

### Points d'attention

- Plus de 1.100 m<sup>3</sup> d'eau ont été utilisés cet été pour arroser les pistes chantier et ainsi éviter d'empoussiérer.
- Le traitement des espèces invasives trouvées sur site a été validé par notre écologue Endemys.
- Depuis le début des travaux, sept tortues d'Hermann ont été trouvées sur le chantier et replacées en zone protégée.
