


POINT DE SITUATION DU PROJET LOREGAZ ACTUALISE AU 31/12/2018

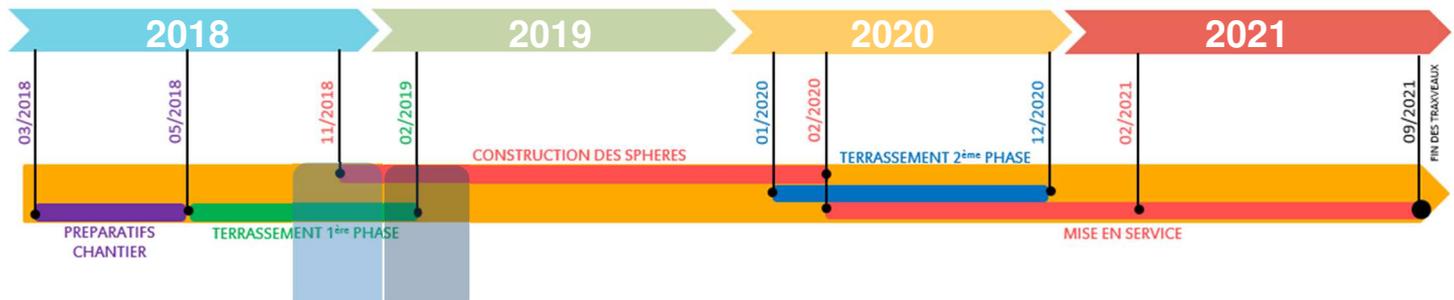

Activités sur la période octobre - décembre 2018

Visite du chantier de construction pour les riverains le 05/10/18 et pour Corse Matin le 04/10/18

Fin des travaux de terrassement et démarrage des travaux de construction des sphères EST et OUEST :

- Réalisation des fondations de chaque sphère (100 m³ de béton de propreté, 50 t de ferrailage et 250 m³ de béton pour le radier)
- Arrivée des premières tôles de sphères (chaque sphère est constituée de 50 éléments)
- Mise en place des ateliers de soudage des sphères



Vue aérienne des terrassements finis



Reprise de terrassements suite aux événements météo du mois d'octobre (voir encart « points d'attention »).

Activités à venir sous 3 mois

Construction des sphères de 2.500 m³ chacune (durée 1 an)

Réalisation des « coquetiers » destinés à supporter les sphères (ouvrages en béton)

Opération de concassage des matériaux extraits du site pour ré-emploi sur le chantier (en zone 2)



Points d'attention

Les pluies diluviennes du dimanche 7 octobre 2018 ont engendré beaucoup de dégâts (ravineurs, brèches...) au niveau des terrassements qui venaient de se terminer par la végétalisation des différents talus. Le délai de remise en état a été d'environ 1,5 mois pour un coût de plus de 400 k€.

La tempête Adrian du jeudi 29 octobre 2018 a également engendré des désordres sur le chantier de LOREGAZ, mais moins importants que lors de l'épisode météo du 7. On a essentiellement dû faire face à des arbres cassés qui ont bloqué les accès ainsi qu'à un balayage de notre clôture de chantier.

Le chantier sera fermé du 22/12/18 au 02/1/19 pendant les fêtes de fin d'année mais gardienné 24h/24.
